


基線通整備事業の進捗状況について

1. これまでの事業経過について

平成27年度	事業認可
平成28～30年度	用地買収
平成31年度	仮設歩道橋製作
令和2年度	仮設歩道橋工事着手
令和3年度	仮設歩道橋完成、旧橋撤去
令和4年度	橋梁上部製作工、橋梁下部工、盛土撤去工
令和5年度	橋梁下部工、擁壁工、階段工

令和6年度 橋梁架設工、擁壁工、路盤工、舗装工、副道工

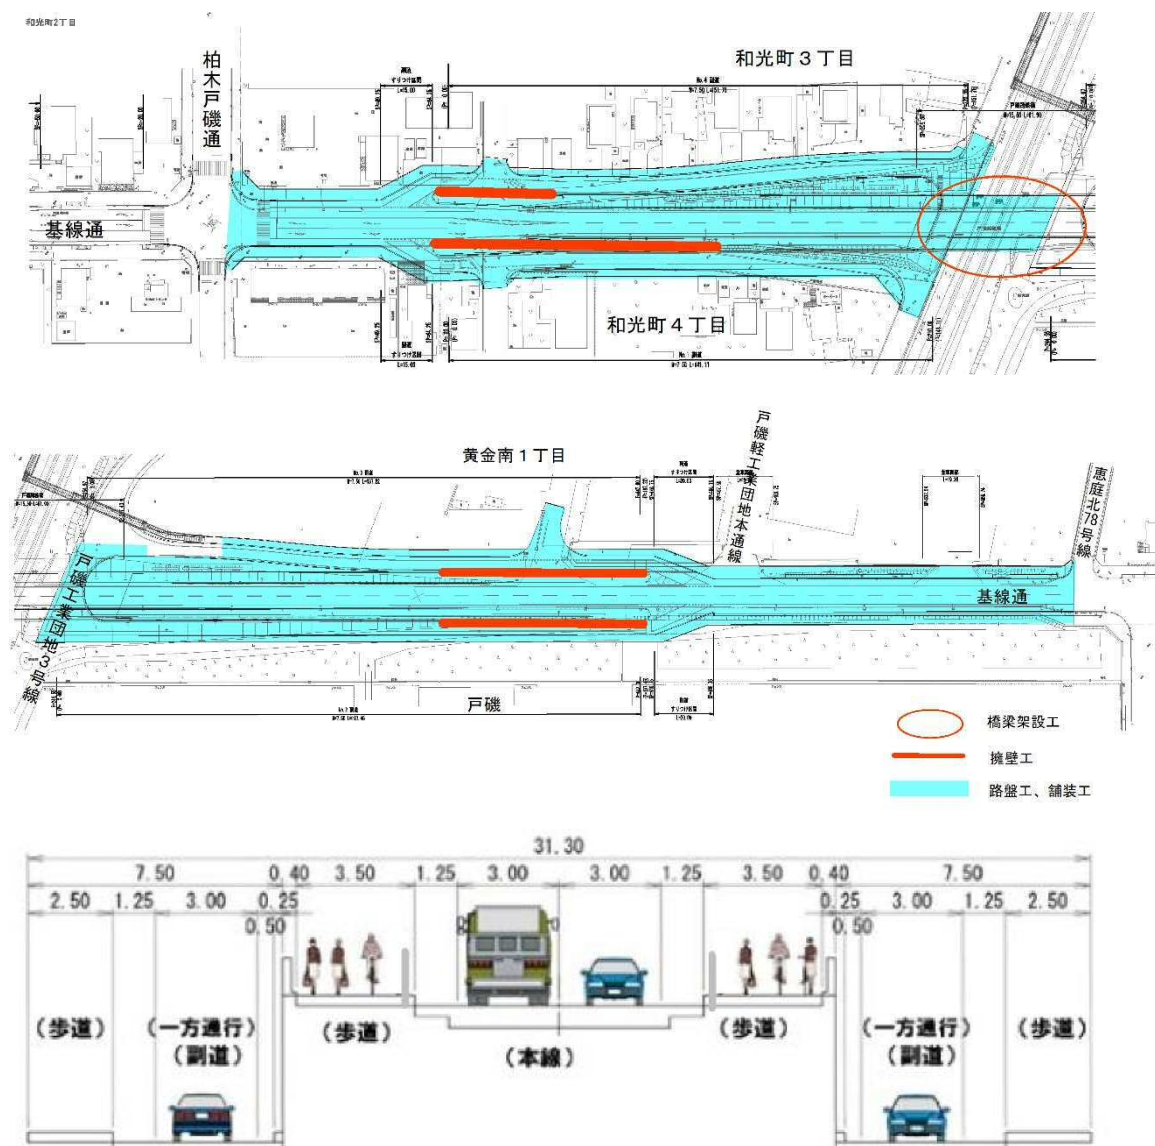

2. 今後のスケジュール等について

令和7年3月予定 基線通供用開始

- ・跨線橋階段は未完成のため、通行止
- ・仮設歩道橋は跨線橋歩道が通行可能になるため、通行止
- ・副道は一方通行で供用

令和7年度 階段工(屋根・照明)、植栽工、凍結防止剤散布装置設置
仮設歩道橋撤去

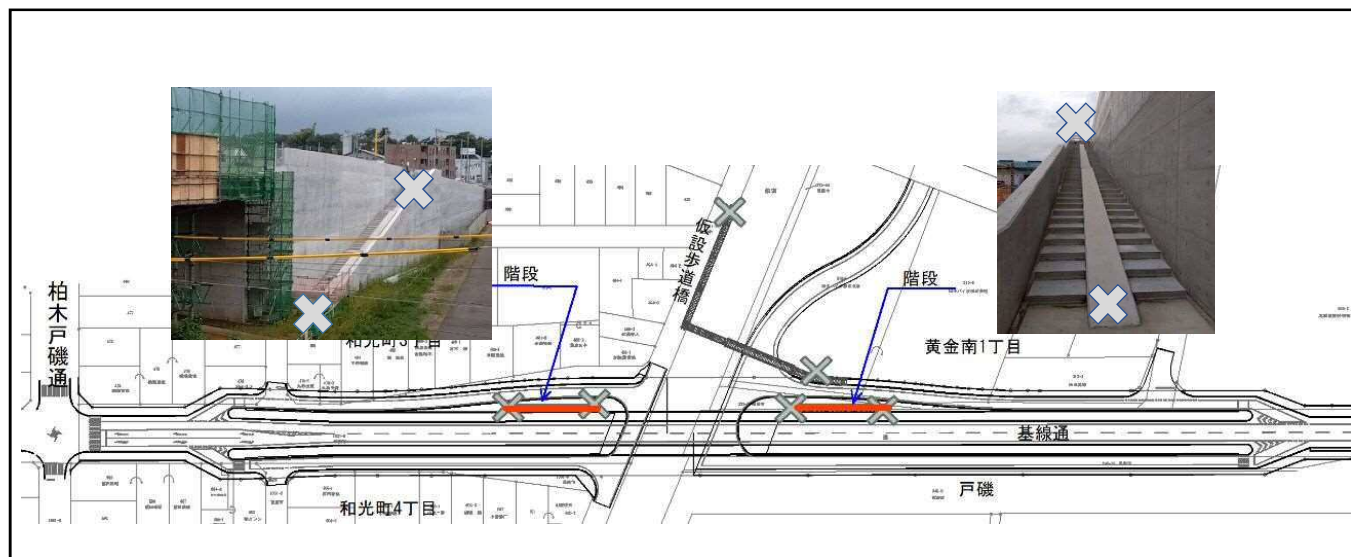


図 R7.3 供用開始時の通行規制

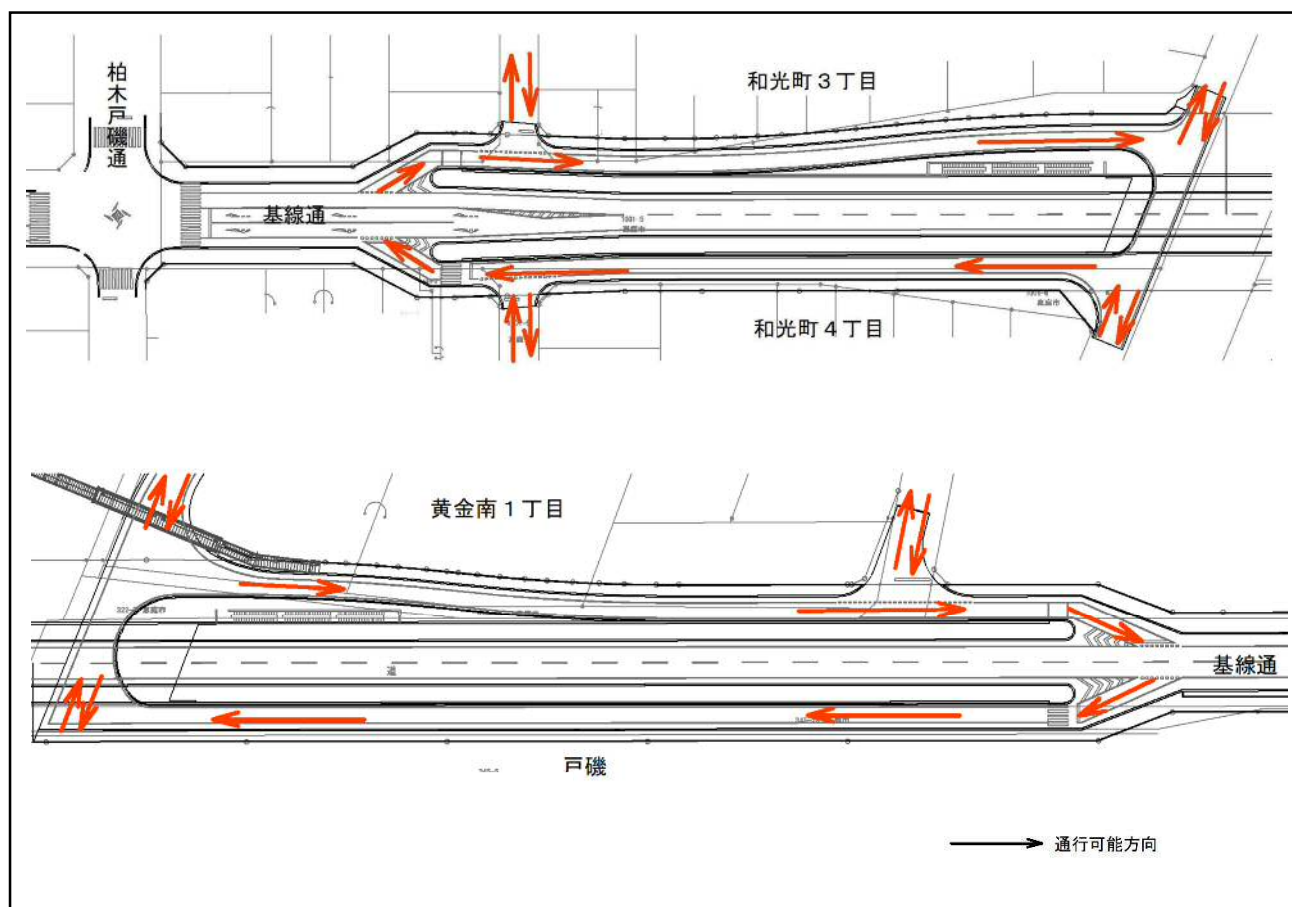


図 副道の通行形態
