


令和6年度 除排雪の状況報告について（令和7年2月25日まで）

1. 降雪状況

（1）令和6年度の降雪状況

令和6年12月の降雪量は62cm、令和7年1月以降は平穏な日が多く経過しましたが、1月29日から30日にかけて30cm、2月は9日から11日にかけて30cmの降雪があり、最大積雪深は60cmとなりました。

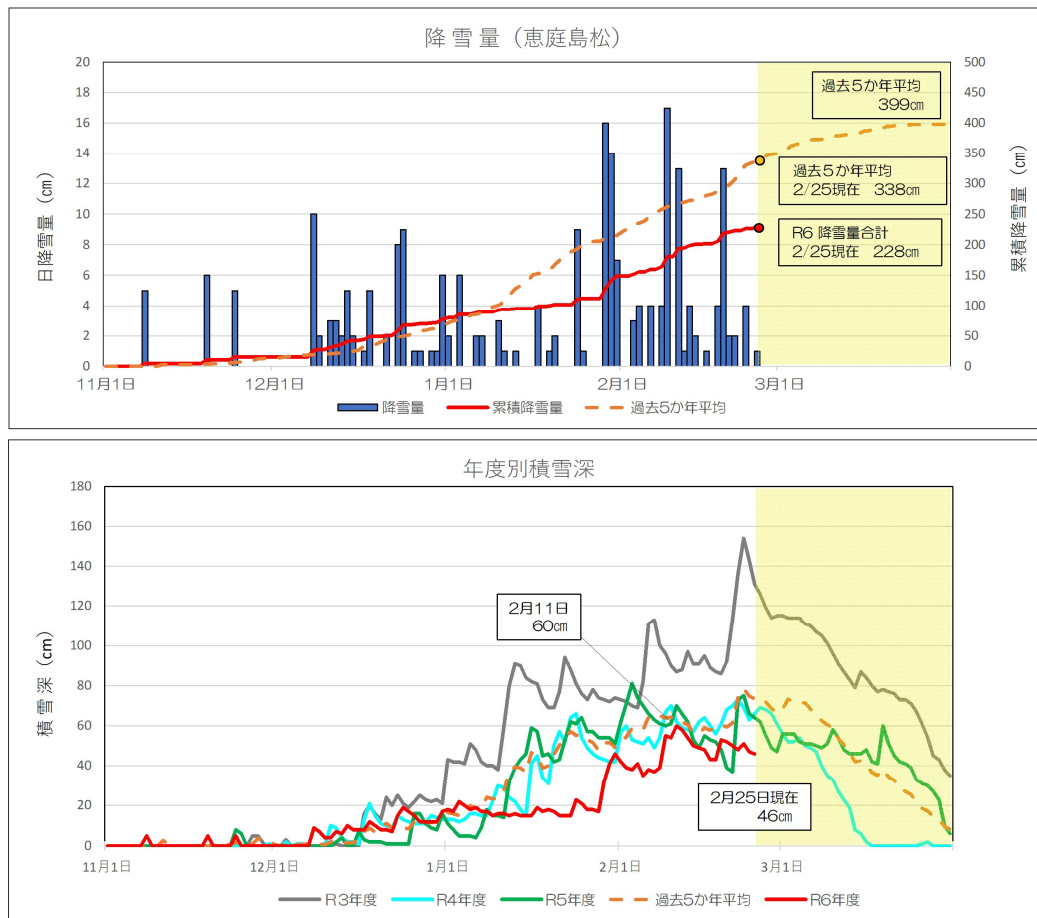

（2）過去5年間の降雪量の比較

令和7年2月25日までの累積降雪量は228cm、最大積雪深は60cmで過去5年間の平均と比較して累積降雪量は110cm、最大積雪深は26cm少ない状況となっています。

		R6年度	参 考					
			R5年度	R4年度	R3年度	R2年度	R1年度	過去5年平均
累積降雪量	基準日：2月25日	228 cm	333 cm	306 cm	439 cm	264 cm	346 cm	338 cm
	年度実績（11月～3月）	— cm	406 cm	329 cm	487 cm	347 cm	425 cm	399 cm
最大積雪深	基準日：2月25日	60 cm	81 cm	73 cm	154 cm	59 cm	61 cm	86 cm
	年度実績（11月～3月）	— cm	81 cm	73 cm	154 cm	85 cm	70 cm	93 cm
	観 測 日	—	2月3日	2月22日	2月23日	3月2日	3月5日	—

2. 除排雪作業実施状況

(1) 委託除排雪実施状況

機械除雪については、一斉除雪 6 回、路面整生で幹線道路 2 回、人力除雪については階段除雪 1 1 回、手押し信号 6 回、凍結防止剤の散布を 4 2 回実施しています。

路線排雪については 1 4 日（昼間 4 0 時間、夜間 8 5 時間）で 5 0 路線 4 8. 8 km、交差点排雪は 3 4, 9 6 2 m³の実施となっています。

委託除排雪作業実施状況

作業内容		R6年度 2月25日まで	参 考						
			R6年度計画	R5実績	R4実績	R3実績	R2実績	R1実績	過去5ヵ年平均
機械除雪	一斉除雪	6 回	10 回	10 回	10 回	12 回	8 回	8 回	10 回
	幹線のみ	2 回	回	3 回	1 回	5 回	3 回	3 回	3 回
	歩道のみ	0 回	回	3 回	3 回	3 回	3 回	4 回	3 回
人力除雪	階段	11 回	20 回	21 回	17 回	20 回	18 回	22 回	20 回
	手押し信号	6 回	9 回	12 回	17 回	15 回	13 回	12 回	14 回
凍結防止剤散布		42 回	50 回	50 回	43 回	40 回	50 回	54 回	47 回
路線排雪	排雪日数	14 日	21 日	22 日	11 日	61 日	6 日	10 日	22 日
	(日中)	40 時間	40 時間	40 時間	16 時間	48 時間	25 時間	20 時間	30 時間
	(夜間)	85 時間	160 時間	170 時間	95 時間	550 時間	27 時間	100 時間	188 時間
	排雪路線数	50 路線	42 路線	59 路線	64 路線	94 路線	19 路線	42 路線	56 路線
	排雪延長	48.8 km	33.4 km	40.9 km	42.3 km	87.3 km	12.9 km	45.7 km	45.8 km
	排雪量	23,817 m ³	45,100 m ³	72,194 m ³	30,340 m ³	170,906 m ³	16,420 m ³	72,870 m ³	72,546 m ³
交差点排雪		34,962 m ³	43,000 m ³	121,960 m ³	89,402 m ³	167,068 m ³	75,291 m ³	58,676 m ³	102,479 m ³
拡幅積上除雪		0 時間	330 時間	346 時間	204 時間	1,250 時間	4 時間	50 時間	371 時間

(2) 直営除排雪作業実施状況

車道除雪については、全線除雪 1 2 回、部分除雪 6 回、歩道除雪は全線除雪 6 回、部分除雪 1 回出動しています。

路線排雪については 1 1 日間で 2 0 路線 1 9. 3 km、拡幅積上除雪を 8 日実施しています。

直営除排雪作業実施状況

作業内容		R6年度 2月25日まで	参考					過去5ヵ年平均
			R5実績	R4実績	R3実績	R2実績	R1実績	
車道除雪	全線除雪	12 回	16 回	19 回	21 回	13 回	16 回	17 回
	部分除雪	6 回	15 回	11 回	28 回	16 回	18 回	18 回
歩道除雪	全線除雪	6 回	13 回	12 回	15 回	9 回	12 回	12 回
	部分除雪	1 回	3 回	0 回	7 回	5 回	1 回	3 回
路線排雪	排雪日数	11 日	24 日	31 日	34 日	22 日	15 日	25 日
	排雪路線数	20 路線	39 路線	81 路線	41 路線	65 路線	40 路線	53 路線
	排雪延長	19.3 km	20.9 km	48.7 km	29.4 km	40.5 km	46.8 km	37.3 km
	排雪量	6,425 m ³	23,760 m ³	29,230 m ³	46,960 m ³	26,840 m ³	20,025 m ³	29,363 m ³
拡幅積上除雪		8 日	27 日	30 日	27 日	12 日	18 日	23 日
