

南 18 ルルマップ川橋の架替えについて

1. 概要

北海道が実施するルルマップ川の河川改修に伴い、南 18 ルルマップ川橋の架替を行うもの。
架替に合わせ道路幅員を広げ、歩行者空間の確保を行う。


事業主体：北海道

事業期間：令和 6 年度～10 年度

橋梁延長：20.1m(現況 9.8m)

橋梁幅員：8.0m(橋梁現況 6.6m)

費用負担：幅員拡幅分は恵庭市負担

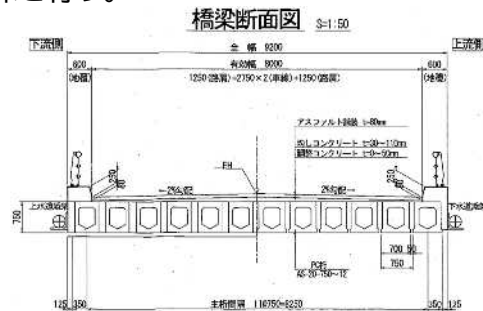

2. 事業予定の変更

令和 6 年度 協定締結、用地測量調査

令和 7 年度 仮道・仮橋設置 → 仮道設置(右岸)

令和 8 年度 旧橋撤去、橋梁下部工 → 仮道(左岸)・仮橋設置・旧橋撤去、橋梁下部工

令和 9～10 年度 橋梁上部工、道路工、仮道・仮橋撤去、排水工

※西 7 線から地先病院までの本事業区間外の歩行者空間整備は、橋梁工事に合わせ
恵庭市施工で実施。

3. 令和 7 年度の事業スケジュールの変更

・仮橋用地借地・補償契約(6 月～12 月)

・工事名：ルルマップ川(特)改修工事(地域改良)

入 札 令和 7 年11月中旬

工 期 令和 7 年11月下旬～令和 8 年 3 月下旬

工事範囲

